

# Les Ussees

CONTRAT  
DE RIVIÈRES



## Comité de Bassin des Ussees Bilan 2018 – Prévisions 2019

Mars 2018


Rappels Contrat  
de Rivières &  
Comité de Bassin

Les Usse  
CONTRAT  
DE RIVIÈRES



## LE COMITÉ DE BASSIN

**Comité de Bassin = instance de concertation représentative de tous les intérêts en cause sur le bassin versant, chargée du suivi des actions du Contrat de Rivières du bassin versant des Usse**



**Le Comité de Bassin des Usse a été instauré par arrêté préfectoral du 7 décembre 2009**

## LE COMITÉ DE BASSIN

Le Comité de Bassin se réunit à minima une fois par an pour faire le bilan des actions du Contrat de Rivières réalisées l'année précédente et annoncer les actions qui seront engagées dans l'année à venir

Il peut cependant être amené à se réunir plus, lorsqu'une décision implique l'ensemble du collège constituant le Comité de Bassin (*exemple : validation du Contrat de Rivières en 2013...*)



## LE COMITÉ DE BASSIN

Le Comité de Bassin n'est pas le SMECRU (Syndicat Mixte d'Exécution du Contrat de Rivières des Ussees) :

- Le SMECRU est un des membres du Comité de Bassin des Ussees (collège des collectivités territoriales)
- Le SMECRU assure le secrétariat technique et administratif du Comité de Bassin des Ussees, et l'animation et le pilotage du Contrat de Rivières des Ussees
- Le SMECRU est également maître d'ouvrage de  $\frac{3}{4}$  des actions du Contrat de Rivières des Ussees

## LE CONTRAT DE RIVIÈRES

**Les grands objectifs du Contrat de Rivières des Usse :**

**Volet A : Lutte contre les pollutions et l'amélioration de la qualité de l'eau**

**Volet B : Gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques :**


*Volet B1-1 : Restauration de la dynamique physique et de la continuité biologique et sédimentaire des cours d'eau*

*Volet B1-2 : Restauration et préservation des zones humides ainsi que des habitats aquatiques et rivulaires*

*Volet B2 : Gestion quantitative de la ressource en eau et des usages*

**Volet C : Gestion durable et concertée de l'eau sur le bassin versant**

## LE CONTRAT DE RIVIÈRES



Le Contrat de Rivières des Usses est compatible avec le **SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse** et répond à la **Directive Cadre européenne sur l'eau** du 23 octobre 2000


Cette Directive demande à chaque Etat-membre d'atteindre un « **bon état écologique des masses d'eau** » : c'est le but de la mise en œuvre du Contrat de Rivières

Bilan des actions 2017  
et  
perspectives 2018

Les Usse  
CONTRAT  
DE RIVIÈRES



## Le bassin versant des Usse (Carte - Annexe 1)

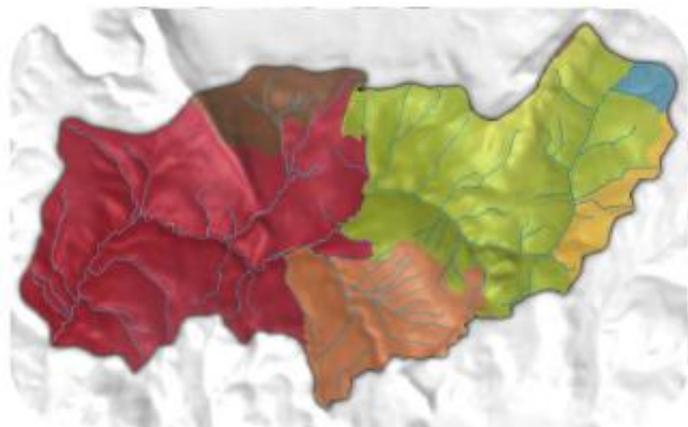


- **Les chiffres clés :**

- 306 km<sup>2</sup> de superficie en Haute-Savoie (74)
- 33 000 habitants
- 385 km de cours d'eau
- 630 ha de zones humides

- **Les EPCI-FP concernés** (Carte - Annexe 2) :

- CC Usse et Rhône
- CC du Pays de Cruseilles
- CC Fier et Usse
- CC du Genevois
- CC Arve et Salèves
- CA du Grand Annecy

- Le SMECRU emploie **4 agents** (3,75 ETP)

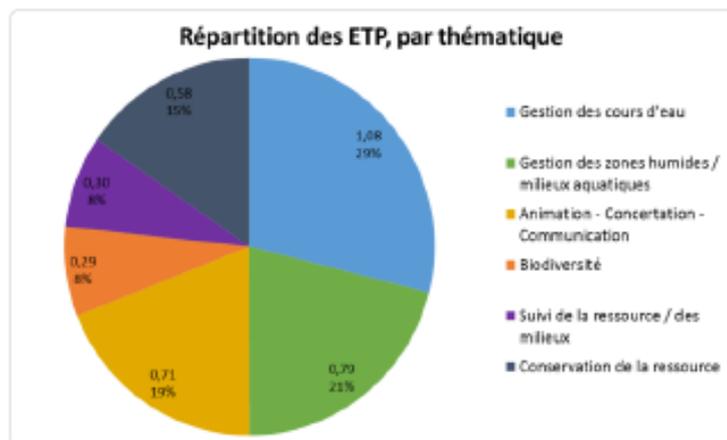

## Nombre de membres au sein du Comité syndical



# Point méthodologique sur la lecture du document

Année d'exécution de la fiche-action

Volet et année de bilan et de perspective

Désignation du maitre d'ouvrage  
« → » Signifie une modification de maîtrise d'ouvrage

VOLET A – Bilan 2017 et perspectives 2018

Les Usages  
CONTRAT  
DE RIVIERES

[Placeholder]

MO:

Code, intitulé et objectif fiche action

VA.AGRI 1: XXXXXX

OBJECTIF : YYYYYYYYYYYYY

Sous action et avancement

- XXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX

Avancement : [Placeholder]

Avancement : [Placeholder]


Commentaires sur la fiche action

→ ZZZZZZZZZZZZZZ

Indique que l'action a lieu en année N

Etat de l'engagement financier de la fiche action

Montant action : €  
Dépenses engagées : €



# VOLET A: LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET RECONQUÊTE DE LA QUALITÉ DES EAUX



2018

MO: SMECRU

## VA.AGRI 1: DIAGNOSTICS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

OBJECTIF : AMÉLIORER LA CONNAISSANCE

● Diagnostics des exploitations agricoles

Avancement : **modifié**

● Mesures correctives MAEC

Avancement : **suspendu**

→ *Pas d'intérêt pour les mesures agro-environnementales et climatiques.*

*Modification du projet initial : réalisation de diagnostics d'exploitations agricoles en contexte zones humides*

Montant action : 40 000 €

Dépenses engagées : 0 €

Mission 2018  
Chargée d'Etude  
ZH

2018

MO: CASMB → SMECRU

## VA.AGRI 2 : CRÉATION DE CARTES D'APTITUDE A L'ÉPANDAGE DES EFFLUENTS AGRICOLES

OBJECTIF : AMÉLIORER LA CONNAISSANCE

- Cartes sur les 3 sous bassins versant (BV) en Excédents d'azote et de phosphore
- Cartes communales à l'échelle du BV

Avancement : **suspendu**

Avancement : **suspendu**

→ *Glissement de la maîtrise d'ouvrage de la Chambre d'Agriculture vers le SMECRU. Cette action n'étant pas subventionnée, sa réalisation sera menée si reliquat financier en fin de Contrat de Rivières ou reprise du point spécifique dans le cadre de l'étude Qualité.*

Montant action : 146 000 €

Dépenses engagées : 0 €

Etude qualité  
Mission 2018,  
Technicien rivières

2014 - 2018

MO: SMECRU

## VA.PHYTO 1: MISE EN PLACE D'UN PLAN DE DÉSHERBAGE COMMUNAL ET D'UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS

*OBJECTIF : RÉDUIRE L'UTILISATION DES PHYTOSANITAIRES À LA SOURCE*

● Plan de désherbage communal

Avancement : **en finalisation**

● Formation du personnel communal/achat matériel

Avancement : **en finalisation**

→ *28/41 communes signataires de la démarche (abandon de 4 communes en cours d'accompagnement). 13 demandes de subvention pour l'achat de matériel de désherbage alternatif. Communes ayant abandonné ou non signataires : Cruseilles, Copponex, Saint Blaise, Cernex, Villy le Pelloux, Jonzier Epagny, Chaumont, Desingy, Droisy, Chavannaz, Evires, Musières*

Montant action : 96 500 €

Dépenses engagées : 78 000 €

2018...

MO: SMECRU → CASMB

## VA.PHYTO 2: MISE EN PLACE DE PLATEFORMES DE REMPLISSAGE ET DE LAVAGE DES PULVÉRISATEURS

*OBJECTIF : LIMITER LES POLLUTIONS PONCTUELLES ET ACCIDENTELLES PAR LES PESTICIDES*

- Etude : identification des lieux pour les plateformes
- Construction des plateformes communales
- Construction des plateformes agricoles

Avancement : **Action démarré**

Avancement : **suspendu**

Avancement : **non démarré**

→ *Glissement maîtrise d'ouvrage du SMECRU vers la CASMB. Projet de construction de plateformes communales abandonné car Loi Labbé sur le 0 pesticide.*

Montant action : étude 15 K€, W 560 k€  
Dépenses engagées : 0 €

Mission 2018,  
CASMB

2018...

MO: SMECRU → CASMB

## VA.IUR 1, IUR 2, IUR 3, IUR 4 : DIAGNOSTIQUER, QUALIFIER LES PRESSIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE

*OBJECTIF : LIMITER LES POLLUTIONS DIFFUSES, L'EUTROPHISATION...*

● Etudes

Avancement : **non démarré**

→ Les 3 actions ne pouvant pas être lancées en 2018, leurs problématiques seront étudiées dans le cadre de l'étude Qualité.

Montant action : 129 000 € (études et outils de sensibilisation...)

Dépenses engagées : 0 €

Etude qualité  
Mission 2018,  
Technicien rivières

# VOLET B: GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES



VOLET B1.1 : restauration de la dynamique physique et de la continuité biologique et sédimentaire des cours d'eau



VOLET B1.2 : restauration et préservation des zones humides ainsi que des habitats aquatiques et rivulaires

VOLET B2 : gestion quantitative de la ressource en eau et des usages



2018...

MO: SMECRU

## VB1.1 DF1 ET DF2 : STRATÉGIE FONCIÈRE ET ACQUISITION DE PARCELLES À FORTE RECHARGE SÉDIMENTAIRE

*OBJECTIF : MAITRISE FONCIÈRE POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE LA RIVIÈRE*

- Etude : analyse foncière
- Acquisition foncière

Avancement : **démarré**

Avancement : **démarré**

→ *Partenariat avec TERRACTEM pour expertise foncière (coût global des acquisitions), analyse dureté foncière (identification des propriétaires fonciers), appui à la définition de la stratégie foncière, réalisation dossier d'enquête pour une déclaration d'utilité publique (DUP), appui administratif pour des acquisitions foncières*

Montant action : étude 25 000 €, acquisition 230 K€  
Dépenses engagées : 0 €

Mission 2018,  
Technicien rivières  
et Chargée ZH

2014 - 2018

MO: SMECRU

## VB1.1 DF3 : GESTION DES MATÉRIAUX SOLIDES

OBJECTIF : RESTAURER LES LARGEURS ET FAVORISER LA DYNAMIQUE DES USSES

● Etudes

Avancement : **terminé**

● Travaux

Avancement : **en cours**

→ Cf cartes ci après


Montant action : étude 100 K€, W 732 K€

Dépenses engagées : 294 K€

Mission 2018,  
Technicien rivières

## VB1.1 DF3 : GESTION DES MATÉRIAUX SOLIDES

OBJECTIF : RESTAURER LES LARGEURS ET FAVORISER LA DYNAMIQUE DES USSES

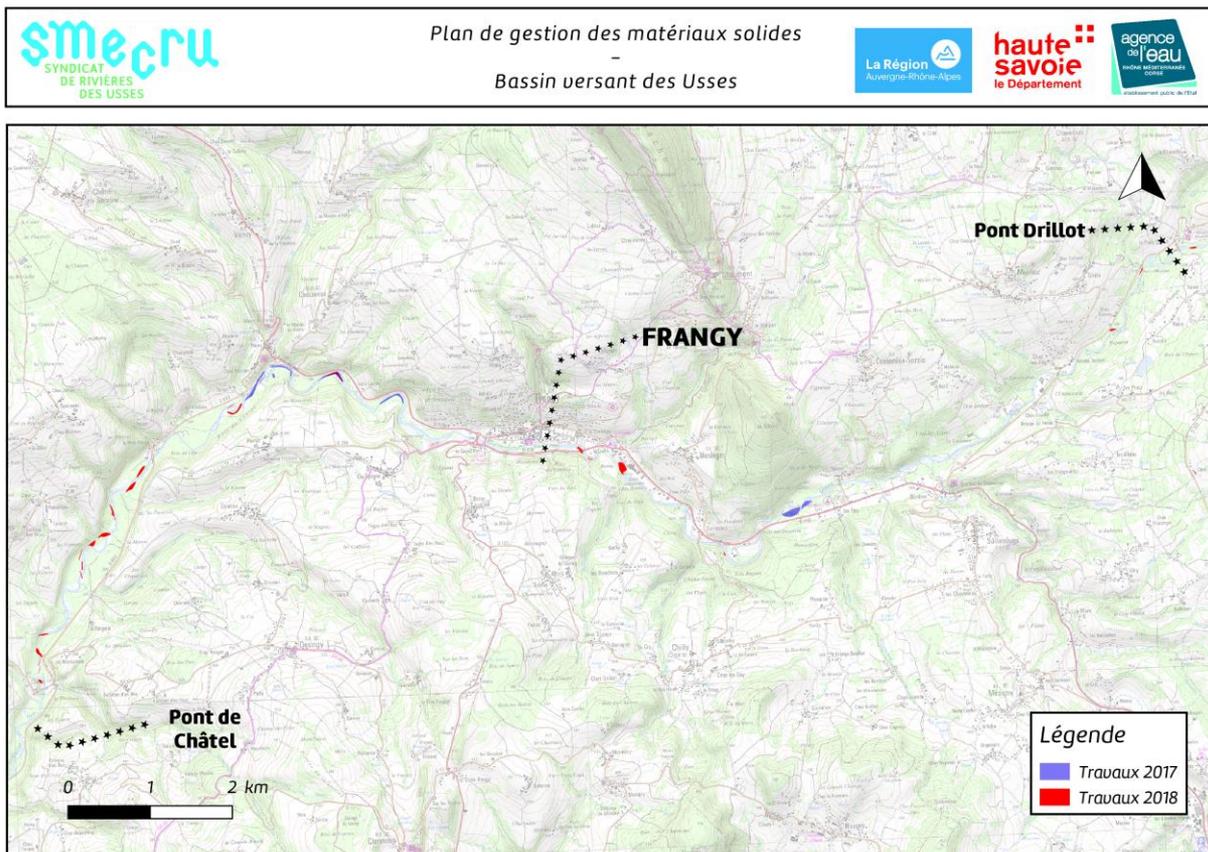

2015 - 2018

MO: SMECRU

## VB1.1 DF4 : FAVORISER LA MOBILITÉ DU LIT AU DROIT DE CONTAMINE-SARZIN

*OBJECTIF : RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DU LIT*

- Etudes
- Travaux

Avancement : **en cours**

Avancement : **non débuté**

→ *Etude au stade avant-projet détaillé, finalisation bloquée pour des raisons foncières. Refus de dialogue du propriétaire. Intervention de TERRACTEM : prestataire pour faciliter les démarches foncières (cf FA DF1 et DF2)*

Montant action : étude 60 K€, W 230 K€, suivi 30 K€,  
communication 49,2 K€  
Dépenses engagées : étude 27 K€

Mission 2018,  
Technicien rivières

2014 - 2018

MO: CD74

## VB1.1 DF5 ET DF6 : AMONT PONT DES DOUATTES ET MÉANDRES DE MONS

*OBJECTIF : RENATURATION/MAINTIEN DE LA MOBILITÉ*

● Etudes

Avancement : **en cours**

● Travaux

Avancement : **suspendu**

→ *Demandes environnementales complémentaires de la DREAL ayant eu pour conséquence la suspension des 2 actions.*

Montant action : étude 75 K€, W 708 K€, communication 12 K€  
Dépenses engagées : 0 €

2016-2017

MO: SMECRU

## VB1.1 CONT 1 : RESTAURATION CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE AU DROIT DU SEUIL DE CHOSAL

*OBJECTIF : RESTAURATION CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE*

- Etudes
- Travaux

Avancement : **terminé**

Avancement : **terminé**

→ *Action finalisée. Intervention complémentaire sur l'affluent de Pesse Vielle*

Montant action : étude 50 K€, W 310 K€, sensibilisation 48 K€  
Dépenses engagées : étude 50 K€, W 302 K€

## VB1.1 CONT 1 : RESTAURATION CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE AU DROIT DU SEUIL DE CHOSAL

*OBJECTIF : RESTAURATION CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE*



2017-2018

MO: SMECRU

## VB1.1 CONT 2 : AMÉNAGEMENT D'OBSTACLES A LA CONTINUITÉ SUR LE FORNANT, LE CHATEL ET LE FLON

OBJECTIF : RESTAURATION CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

- Etudes
- Travaux

Avancement : **en cours**

Avancement : **non démarré**

- *Etudes techniques réalisées, 2018 dépôts des dossiers loi sur l'eau et réalisation des travaux*
- *Les études sur la réouverture du Flon n'ont pas été engagées du fait des interrogations des différents partenaires sur la pertinence de l'opération. A minima une mesure de pesticides sera réalisée dans l'étude qualité.*

Montant action : étude 45 K€, W 662 K€  
Dépenses engagées : étude 18 K€

Mission 2018,  
Technicien rivières

2017-2018

MO: SMECRU

## VB1.1 CONT 3 : AMÉNAGEMENT D'OBSTACLES A LA CONTINUITÉ SUR LES PETITES USSES

*OBJECTIF : RESTAURATION CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE*

- Etudes
- Travaux

Avancement : **démarré**

Avancement : **non démarré**

→ *Etudes techniques en cours, 2018 dépôts des dossiers loi sur l'eau et réalisation des travaux*

Montant action : étude 30 K€, W 311 K€  
Dépenses engagées : 0 €

Mission 2018,  
Technicien rivières

2017-2018

MO: SMECRU

## VB1.1 CONT 4 : AMÉNAGEMENT D'OBSTACLES A LA CONTINUITÉ SUR LA FERANDE

*OBJECTIF : RESTAURATION CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE*

- Etudes
- Travaux

Avancement : **en cours**

Avancement : **non démarré**

→ *Etudes techniques en cours, 2018 dépôts des dossiers loi sur l'eau et réalisation des travaux*

Montant action : étude 29,5 K€, W 145 K€  
Dépenses engagées : 15 K€

Mission 2018,  
Technicien rivières

2017-2018

MO: SMECRU

## VB1.1 CONT 5 : ABAISSEMENT DE 3 SEUILS SUR LES USSES

OBJECTIF : RESTAURATION CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

- Etudes
- Travaux

Avancement : **démarré**

Avancement : **non démarré**

→ *Marché infructueux en 2017. Nouvelle consultation fin 2017, lancement étude 2018*

Montant action : étude 30 K€, W 150 K€  
Dépenses engagées : 0,3 K€

Mission 2018,  
Technicien rivières

2018...

MO: SMECRU

## RISQ 1 : GESTION DES EMBÂCLES

OBJECTIF : GESTION EMBÂCLE

- Etudes
- Travaux

Avancement : **non démarré**

Avancement : **non démarré**

→ *Marché infructueux en 2017. Nouvelle consultation fin 2017, lancement étude 2018*

Montant action : étude 24 K€, W 90 K€  
Dépenses engagées : 0 K€

Mission 2018,  
Technicien rivières

2017-2018...

MO: SMECRU

## VB1.2 ABR : AMÉNAGEMENT D'ABREUVOIRS SUR LES COURS D'EAU A FORT ENJEUX ÉCOLOGIQUES

OBJECTIF : PROTECTION DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES HABITATS

- Etude
- Travaux

Avancement : **en cours**

Avancement : **démarré**

→ *Emplacement et typologie des futurs abreuvoirs définis, convention avec les propriétaires signées, travaux au printemps 2018*

Montant action : étude 6,7 K€, W 67,5 K€

Dépenses engagées : étude 2,4 K€, W 22,6 K€

Mission 2018,  
Technicien rivières

2014 – 2018...

MO: SMECRU

## VB1.2 PGBB : PLAN DE GESTION DES BOISEMENTS DE BERGES ET DU BOIS MORT

*OBJECTIF : GESTION/RESTAURATION DES BERGES*

● Travaux

→ Cf cartes ci après


Avancement : **en cours**

Montant action : 654,5 K€  
Dépenses engagées : 239 K€

Mission 2018,  
Technicien rivières

## VB1.2 PGBB : PLAN DE GESTION DES BOISEMENTS DE BERGE ET DU BOIS MORT

*OBJECTIF : OBJECTIF : GESTION/RESTAURATION DES BERGES*

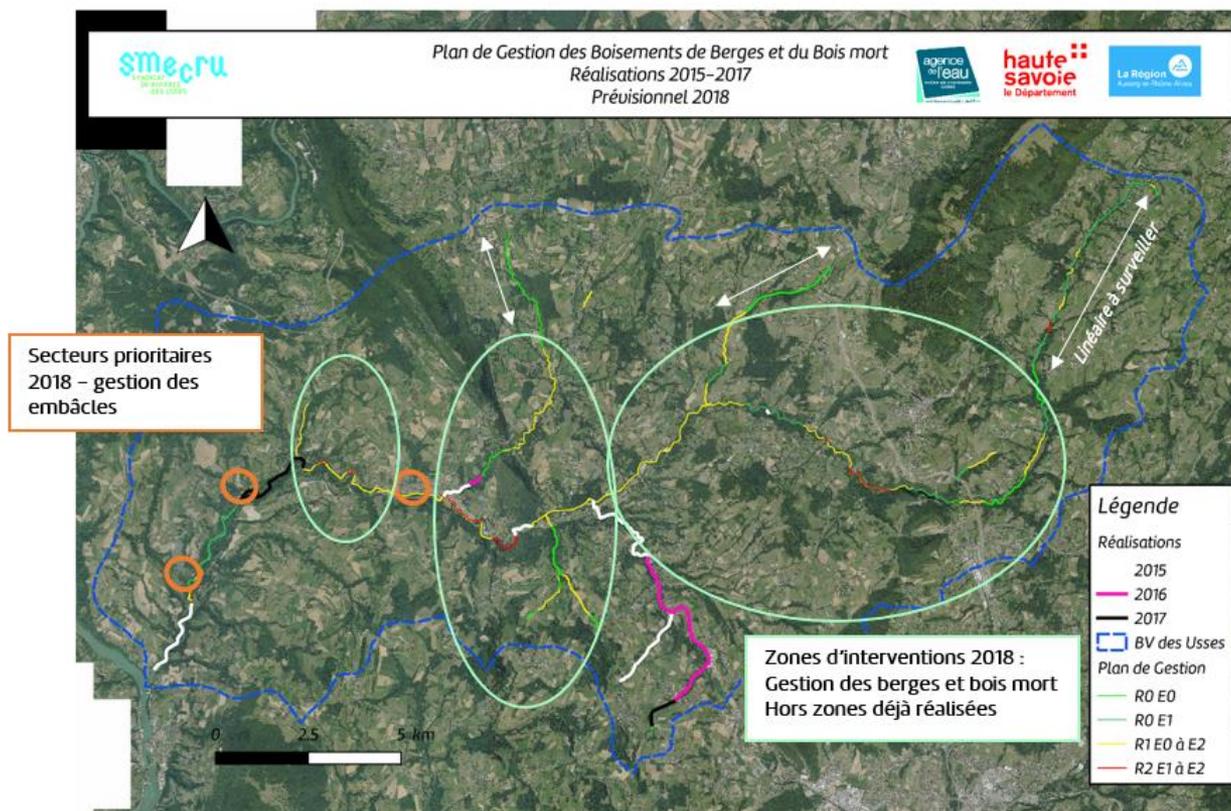

2014 – 2018...

MO: SMECRU

## VB1.2 INV : PLAN DE LUTTE CONTRE LES INVASIVES

*OBJECTIF : PRÉSERVER ET RESTAURER LA BIODIVERSITÉ DES MILIEUX*

● Travaux renouvelés

→ *Lutte manuelle en cours, démarrage lutte mécanique en 2018*

● Travaux solidage en zone humide

→ *Rendu d'étude en 2017, faisabilité et lancement des luttes sur les zones humides contre le solidage en 2018 (chargée de projets ZH)*

Avancement : **en cours**


Montant action : étude 75 K€, W 300 K€

Dépenses engagées : W 61 K€

Mission 2018,  
Technicien rivières  
et Chargée ZH

## VB1.2 INV : PLAN DE LUTTE CONTRE LES INVASIVES

OBJECTIF : PRÉSERVER ET RESTAURER LA BIODIVERSITÉ DES MILIEUX

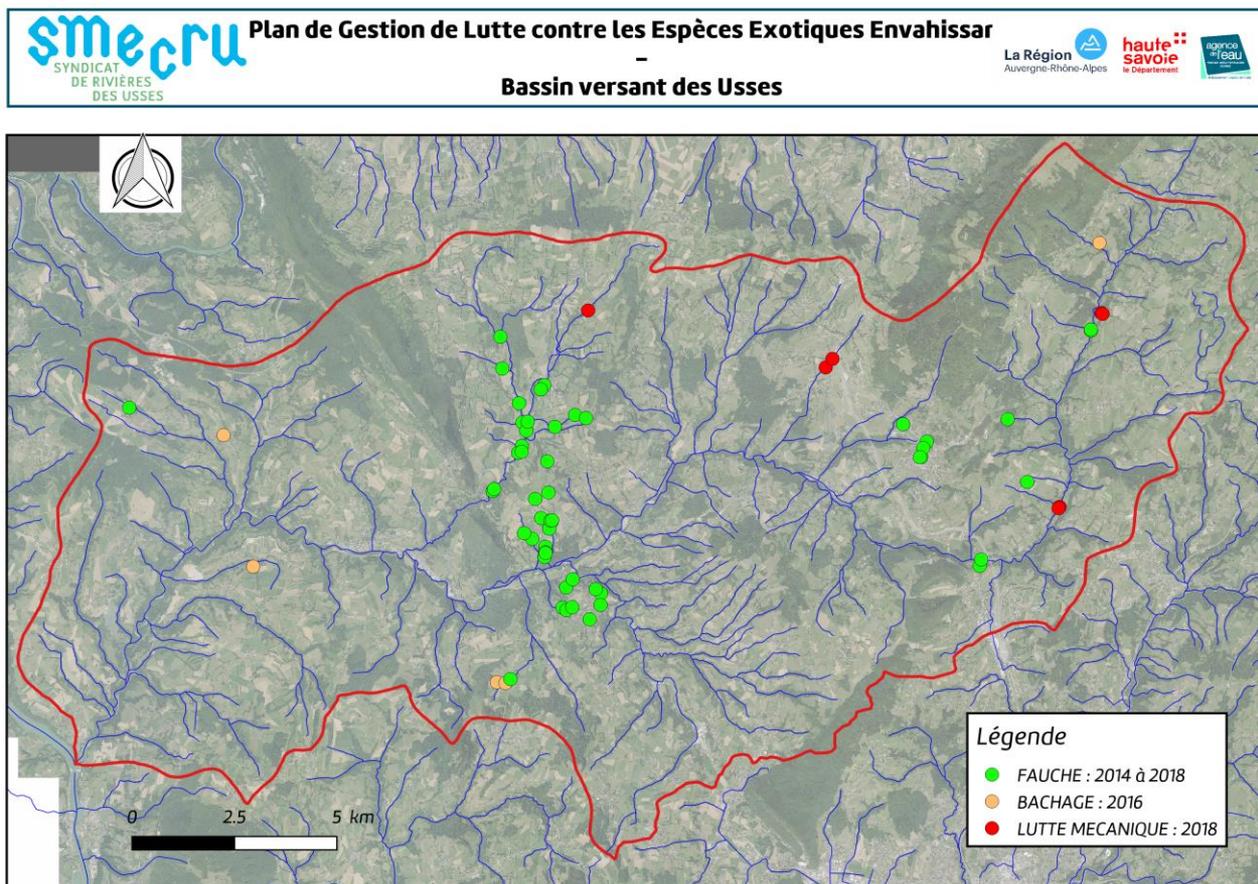

2016 – 2018...

Etude MO: SMECRU  
Travaux MO : CT

## VB1.2 ZH2 : RESTAURATION, GESTION ET VALORISATION DES ZONES HUMIDES (DONT 18 PRIORITAIRES)

OBJECTIF : PROMOUVOIR LA PRÉSERVATION DES ZONES HUMIDES

- Etude : notices de gestion
- Etude : stratégie ZH
- Travaux et animation foncière

Avancement : **finalisé**

Avancement : **non démarré**

Avancement : **en cours**

- *Etude hors cadre CR : Groisy et Site non lancé : 1/18*
- *Notices de gestion MO SMECRU : 13/18 ; Notices validées : 7/13 les autres courant 2018*
- *Travaux 2017 : 5/7 et 2/18 en mesures compensatoires*
- *Etude stratégie ZH pour 2018 (lien avec le pré-schéma gestion des eaux pluviales)*

Montant action : étude 110 K€, W 800 K€ (ZH Groisy travaux très élevés), Acquisition 75 K€, pédagogie/animation 72 k€, Suivi 23 K€  
Dépenses engagées : étude 64 K€, animation 7 K€

Mission 2018,  
Chargée ZH

## VB1.2 ZH2 : RESTAURATION, GESTION ET VALORISATION DES ZONES HUMIDES (DONT 18 PRIORITAIRES)

OBJECTIF : PROMOUVOIR LA PRÉSERVATION DES ZONES HUMIDES



2016 – 2018...

MO: SMECRU

## VB1.2 ZH1 : ANIMATION TERRITORIALE ET SENSIBILISATION DES ZONES HUMIDES

*OBJECTIF : PROMOUVOIR LA PRÉSERVATION DES ZONES HUMIDES*

● Animation territoriale

Avancement : **en cours**

- *En 2017, premières animations grand public sur le BV : 50 personnes pour 5 sorties*
- *Journée à destination des élus : Zones humides et Aménagement du territoire : 60 personnes le 31/01/2017 + édition d'un guide (100 exemplaires)*

Montant action : 108 K€

Dépenses engagées : 61,6 K€

Mission 2018,  
Chargée ZH

2018...

MO: SMECRU et  
collectivités

## VB1.2 MP1, MP3 : PRÉSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE LIÉ A L'EAU

*OBJECTIF : PRÉSERVER ET RESTAURER LE PATRIMOINE LIÉ A L'EAU*

- Etude
- Travaux

Avancement : **en cours**

Avancement : **non démarré**

→ Fin 2017, les collectivités se sont positionnées pour engager ou non les sous-action : elles se lanceront en 2018.

Montant action : 93,5 K€  
Dépenses engagées : 0 K€

Mission 2018,  
Chargée ZH

2018...

MO: SMECRU, communes  
et comcom Usse et Rhône

## VB2. VP1 : 18 DIAGNOSTICS ET SCHÉMA TERRITORIAL GESTION DE LA RESSOURCE

*OBJECTIF : GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU*

- Etude : diagnostics
- Etude : schéma territorial de gestion et d'économie de la ressource en eau

Avancement : **démarré**

Avancement : **démarré**

→ Groupement de commandes effectué, finalisation de l'écriture des documents relatifs au marché, consultation et lancement exécution du marché en 2018.

Montant action : 600 K€

Dépenses engagées : 0 K€



2018...

MO: CASMB

## VB2. VP2 : PLAN D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

*OBJECTIF : GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU*

● Etude

Avancement : **suspendu**

→ *Lancement de l'étude prévu hors délais contractuel du Contrat de Rivières*

Montant action : 420 K€

Dépenses engagées : 0 K€

2018...

MO: SMECRU

## VB2. VP4 : SCHÉMA TERRITORIAL DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

*OBJECTIF : GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU*

● Etude :

Avancement : **démarré**


→ Lancement de l'étude préalable à l'élaboration d'un schéma de gestion des eaux pluviales en 2018. Cette étude sera couplée avec celle portant sur la stratégie zones humides

Montant action : 192 K€

Dépenses engagées : 0 K€

Mission 2018,  
Chargée mission et  
lien avec Chargée  
ZH

# VOLET C: GESTION DURABLE ET CONCERTÉE SUR LE TERRITOIRE, INFORMATION ET SENSIBILISATION

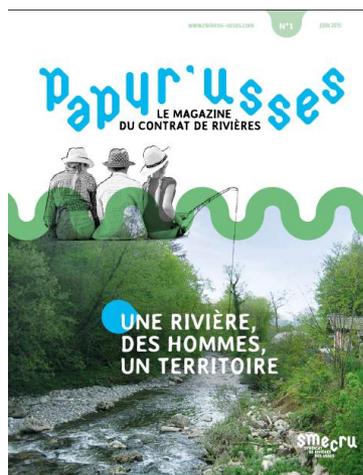

2015 – 2018...

MO: SMECRU


## VC OB.GM1 : SUIVI GÉOMORPHOLOGIQUE GLOBAL

OBJECTIF : ÉVALUER L'EFFICACITÉ DU PLAN DE GESTION, AMÉLIORER LA CONNAISSANCE

- Etude : Acquisition des données topographiques et photographiques : état initial

→ 2018, acquisition d'un relevé LIDAR de fin de contrat en vue de préparer le bilan des actions de restauration hydromorphologique

Avancement : **en cours**

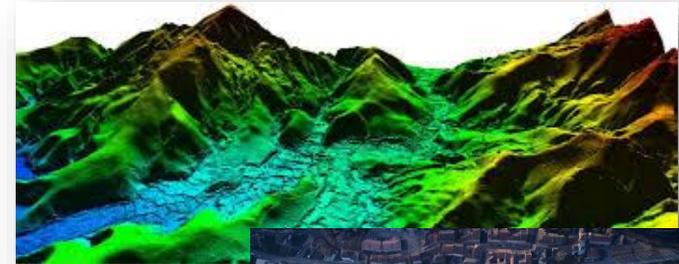

Mission 2018,  
Technicien rivières

Montant action : 73 K€

Dépenses engagées : 17 K€

2018...

MO: SMECRU

## VC OB.GM2 : IDENTIFIER LES SOURCES DE POLLUTION ÉMISES PAR DES DÉPÔTS ET DÉCHARGES

*OBJECTIF : ÉVALUER L'EFFICACITÉ DU PLAN DE GESTION, AMÉLIORER LA CONNAISSANCE*

● Etude

Avancement : **non démarré**

Montant action : 96 K€  
Dépenses engagées : 0 K€



2014 - 2019

MO: SMECRU

## VC OB.PH1, PH2 : OBSERVATOIRE DES PEUPELEMENTS, DES MILIEUX AQUATIQUES ET SUIVI DE LA FRANCHISSABILITÉ

OBJECTIF : SUIVI/AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE

- Etude : Observatoire des peuplements et milieux aquatiques

Avancement : **en cours**

- *Convention avec l'AFB pour le suivi des températures, et convention avec la Fédération de Pêche 74 pour les suivis piscicole et astacicole.*
- *2018 sera consacré à la mise en place du suivi piscicole lié aux opérations de restauration de la continuité écologique.*

Montant action : 257 K€

Dépenses engagées : 92 K€

Mission 2018,  
Technicien rivières

2015 – 2018...

MO : SMECRU

## VC OB.VP : OBSERVATOIRE DES PRÉLÈVEMENTS ET STRATÉGIE DE GESTION DE LA RESSOURCE

OBJECTIF : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE/GESTION

- Suivi annuel des débits d'étiage
- Etude des prélèvements des exploitations agricoles
- Observatoire des usages et des débits
- Gouvernance Ressource en eau

Avancement : **en cours**

Avancement : **finalisé**

Avancement : **démarré**

Avancement : **en cours**

→ *Gouvernance de la ressource en eau : 2017 création d'un groupe de suivi spécifique émanant du Comité de Rivières qui intégrera en son sein, en 2018, des citoyens (Op. Alerte à Malib'Usses)*

→ *2018, lancement de l'étude observatoire des usages et débits. Action en lien avec VB2.VP1*


Montant action : Obs. Débits 108 K€, Obs. Usages 132 K€,  
Gouvernance 63 K€

Dépenses engagées : Obs. Débits 0 K€, Obs. Usages 20 K€, G. 35 K€

Mission 2018,  
Chargée de mission

# VC OB.VP : OBSERVATOIRE DES PRÉLÈVEMENTS ET STRATÉGIE DE GESTION DE LA RESSOURCE

OBJECTIF : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE/GESTION

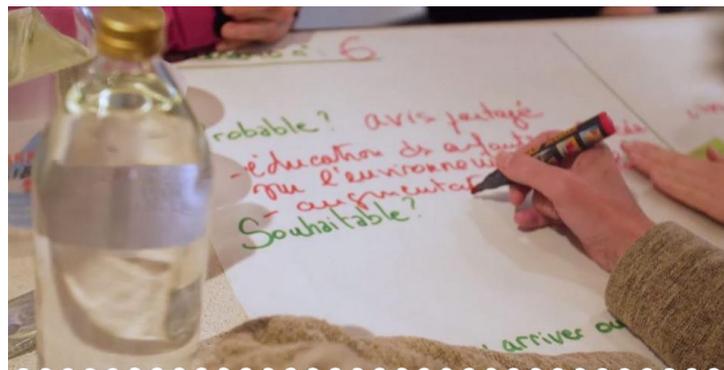

2015 – 2018...

MO : SMECRU

## VBC OB.ZH : SUIVI DU PROGRAMME DE PRÉSERVATION DES ZONES HUMIDES

*OBJECTIF : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE/GESTION*

- Evaluation
- Prospective

Avancement : **non démarré**

Avancement : **non démarré**

- *Prévue en 2018, en lien avec GEMAPI et l'étude Stratégie en Faveur des Zones Humides, et sera réalisée en interne*
- *Il n'est pas encore prévu de prospection : en lien avec l'étude Stratégie ZH*

Montant action : 6 K€  
Dépenses engagées : 0 K€

2018...

MO : SMECRU

## VC OB.QL1, QL2 : OBSERVATOIRE DE LA QUALITÉ DE L'EAU

OBJECTIF : SUIVRE L'ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ

● Etude

Avancement : **non démarré**

→ *L'étude qualité sera lancée en 2018. Compte tenu du fait que certaines actions inscrites au volet A : lutte contre les pollutions n'auront pas été lancées dans les délais du Contrat de Rivières, l'étude qualité devra répondre pour partie aux problématiques soulevées dans les fiches-actions dudit volet A*

Montant action : 336,2 K€  
Dépenses engagées : 0 K€

Mission 2018,  
Technicien rivières

2014 – 2018...

MO: SMECRU

## VC FORM1 : CYCLES D'ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIF : FORMER POUR ANCRER LA GESTION DE L'EAU SUR LE BV

- Dispositif 1 : année 2015 : animations ponctuelles dans les écoles
- Dispositif 2 : définition et mise en place d'un dispositif de classe d'eau

Avancement : **finalisé**

Avancement : **en cours**

→ Le contenu bruts de 4 livres de bords traitant chacun d'une thématiques du Contrat de Rivières : le manque d'eau, le fonctionnement de la rivière, la biodiversité et la qualité, ont été réalisés en 2017. 2018 sera consacré aux maquetages de ces outils, et à la diffusion de ces derniers dans les écoles des 41 communes du bassin versant. Il est prévu des formations à l'utilisation de l'outil auprès des professeurs des écoles.

Montant action : 141 K€  
Dépenses engagées : 61 K€

Mission 2018,  
Chargée de mission

2014 - 2019

MO: SMECRU


## VBC SENS1, SENS 2, SENS 3, SENS 4, SENS 5 : OUTILS D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION DES ACTEURS LOCAUX

*OBJECTIF : INFORMER, SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES ACTEURS*

- Charte graphique et plan de sensibilisation
- Outils de sensibilisation
- Papyr'Ussees, Guides....
- Refonte du site internet, facebook, chaine You Tube

→ *Poursuite des actions de communication et sensibilisation*

Avancement : **en cours**



Mission 2018,  
Chargée de mission

Montant action : 331 K€

Dépenses engagées : 182 K€

## VBC SENS1, SENS 2, SENS 3, SENS 4, SENS 5 : OUTILS D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION DES ACTEURS LOCAUX

**OBJECTIF : INFORMER, SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES ACTEURS**

**WWW.RIVIERES-USSES.COM**

**f SMECRU SYNDICAT DES USSES**

**LES OUTILS**

- Une édition spéciale du Papyr'Usse début septembre
- Des sacs à pain fournis aux boulangeries locales
- Un spot vidéo pédagogique diffusé sur le site Internet du SMECRU, la page Facebook, dans les cinémas locaux et sur les écrans publicitaires des enseignes de grande distribution
- Des films réalisés pendant les animations, avec la participation des habitants, disponibles en ligne
- Des infographies pédagogiques sur la problématique du manque d'eau, la présentation du PGRI, la démarche participative et les arrêtés sécheresse publiés en ligne

Avant chaque animation, des tracts sont diffusés dans les boîtes aux lettres, des affiches et des banderoles positionnées dans des lieux fréquentés, sur le territoire concerné par la manifestation

Une adresse mail dédiée au projet, [alerte@rivieres-usses.com](mailto:alerte@rivieres-usses.com) pour répondre aux questions des citoyens et leur permettre de s'inscrire aux animations

